


UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

En materia de infraestructura, podemos resaltar que durante el año 2011 la Fiscalía gestionó 31 iniciativas de inversión de las cuales 15 de ellas se encuentran en etapa de desarrollo de consultoría, y 13 en etapa de ejecución de obras y 3 en postulación de compra de terrenos ante el Ministerio de Bienes Nacionales .

El presupuesto total asignado para infraestructura durante el año 2011 fue de M\$ 7.619.470 (siete mil seiscientos diecinueve millones cuatrocientos setenta mil pesos), de los cuales se decretaron M\$ 5.084.614 (cinco mil ochenta y cuatro millones seiscientos catorce pesos), ejecutándose un **66,76%** del presupuesto señalado.

Ejecución Marco Presupuestario 2011 al 31 de Diciembre

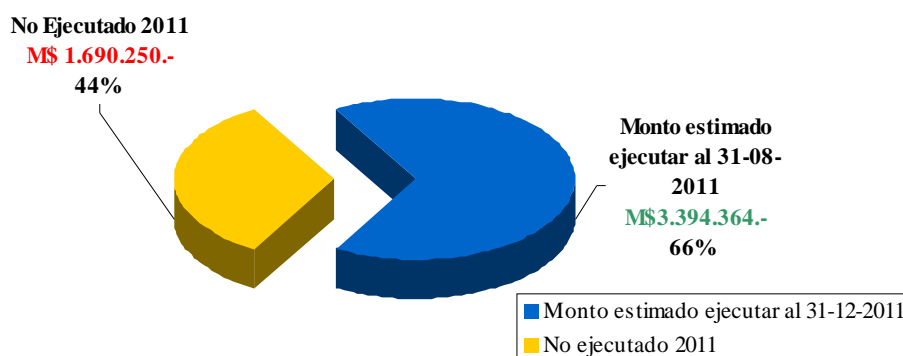

Durante el año 2011 concluyeron su etapa de diseño los proyectos de las Fiscalía Regional y Local de Rancagua, y las fiscalías locales de FL Linares, FL Chillán, FL Lautaro, FL Osorno y FL de Maipú.

PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO - DICIEMBRE 2011								
Región	Fiscalía	Monto \$ Convenio	Monto \$ Adjudicado	Superficie programa	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Término	Observaciones
VI	FR. FL. Rancagua	111.309.000	89.020.350	3133 m2	100%	26/07/10	11/02/11	Terminada
VIII	FL Chillán	50.429.000	39.358.500	1.310 m2	100%	23/11/09	25/08/10	Terminada
IX	FL Lautaro	14.534.000	13.500.000	332 m2	100%	10/06/10	08/10/10	Consultoría terminada. Falta liquidar contrato.
X	FL Osorno	40.036.000	29.427.250	1.040 m2	100%	30/10/09	27/11/10	Terminada
RM	FL Maipú	73.051.000	55.000.000	2.993 m2	100%	16/06/09	18/12/09	Terminada. A la espera de RS por aumento de superficie FR. Occidente

Los proyectos de construcción que llegaron a término durante el año 2011 y que en total suman una superficie total de **6.959** metros cuadrados fueron los siguientes:

- ✓ Fiscalía Local de Antofagasta (II Región)
- ✓ Fiscalía Local de Calama (II Región)
- ✓ Fiscalía Local de Vallenar (III Región)
- ✓ Fiscalía Regional de Talca (VII Región)
- ✓ Fiscalía Local de Curicó (VII Región)
- ✓ Fiscalía Regional de Concepción (VIII Región)
- ✓ Fiscalía Regional de Puerto Montt (X Región)

PROYECTOS EN ETAPA DE EJECUCIÓN - DICIEMBRE 2011													
Región	Fiscalía	Monto \$ Convenio		Monto \$ Adjudicado	Aumentos o Disminuciones de contrato	Nuevo monto Contrato	M2 Projectados	% Avance Físico	Inicio	Término	Nueva fecha de término	En etapa de equipamiento	Observaciones
		Diseño	Obra										
II	FL Antofagasta	949.669.000		949.668.670	-26.451	949.642.219	1.315 m2	100%	16/06/10	13/03/11	15/08/11	✓	Inaugurada
X	FR Puerto Montt	1.292.077.705		1.244.460.034	43.022.515	1.287.482.549	1.266	100%	02/04/10	16/02/11	03/04/11	✓	Inaugurada
VII	F. Regional Talca	1.407.106.645		1.407.106.645	-36.857	1.407.069.788	1.450	100%	29/12/09	22/02/11	31/07/11	✓	Inaugurada
VII	F. Local de Curicó	841.417.000		743.904.270	37.530.072	781.494.342	985	100%	30/12/09	23/02/11	22/08/11	✓	Terminada. Con multas por atraso
II	FL Calama	871.858.462		838.729.286	33.129.176	871.858.462	1.014	100%	14/08/09	09/08/10	25/03/11	✓	Inaugurada
III	FL Vallenar	291.206.754		291.206.754	0	291.206.754	353	100%	19/11/09	15/10/10	14/11/10	✓	Inaugurada
VIII	FR Concepción	1.065.450.264		1.065.450.264	0	1.065.450.264	1.215	100%	21/12/10	21/03/2011	05/04/2011	✓	Inaugurada

Proyecto Construcción del Edificio Institucional Fiscalía Nacional – Ministerio Público.-

Como ya se he señalado en otras oportunidades, desde el inicio de la reforma procesal penal, la Fiscalía de Chile privilegió asegurar la operatividad del sistema e implementar edificios institucionales en las fiscalías regionales y locales del país, mientras que para el funcionamiento de la Fiscalía Nacional se han arrendados sucesivos edificios en los que es muy difícil garantizar estándares mínimos de seguridad asociados a la función de la persecución criminal.

De esta forma dotar al Ministerio Público de un edificio institucional para el funcionamiento de la Fiscalía Nacional se ha constituido en un eje prioritario para esta administración.

En pos de este objetivo, durante el año 2009, se concretó la compra del terreno ubicado en calle Catedral N° 1437, Santiago y durante el año 2010, pese a las dificultades y restricciones presupuestarias de ese año, se realizó la convocatoria al **Concurso de Anteproyecto de Arquitectura denominado Edificio Institucional Fiscalía de Chile**, a través de la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Durante los primeros meses del año 2011 se concretó este llamado, en él se presentaron un total 13 trabajos, revisados por un jurado del más alto nivel, resultando ganador la oficina liderada por el arquitecto Don Luis Corvalán cuyo resultado se dio a conocer un día después de mi Cuenta Pública año 2010, es decir el día 21 de abril a las 12:00 hrs.

A fines del año pasado, concretamente el día 27 de Diciembre la Contraloría General de la República, toma razón de la **Contratación de la Consultoría de Diseño de nuestro Edificio Institucional**. Actualmente se encuentra en pleno desarrollo la consultoría de diseño de arquitectura y especialidades, cuyo desarrollo va a comprometer prácticamente todo el año 2012, la que tiene como plazo de ejecución una duración de 300 días, por lo que esperamos que a fines de Octubre concluir con esta etapa y así gestionar durante los últimos meses del año 2012, la postulación de la etapas de obras al Ministerio de Desarrollo Social para la respectiva recomendación favorable, que nos permita durante los primeros meses del año 2013 dar inicio a la preparación de antecedentes para el llamado a licitación de obras el que esperamos concretar durante el segundo semestre.

Ajuste a la Normativa Sísmica cartera de Inversiones

Dada la relevancia e impacto negativo que tuvo en la infraestructura el terremoto del 27 de febrero de 2010.-, dónde al igual que otras instituciones públicas vimos afectados algunos de nuestros inmuebles, durante el año 2011 lamentablemente no pudimos avanzar en la etapa de obra en ningún proyecto de inversión que había concluido su respectiva consultoría de diseño, ello debido a que nos vimos en la necesidad de reformular la gran mayoría de nuestras iniciativas de inversión a los requerimientos de la nueva normativa sísmica la que entró en vigencia durante el año recién pasado.

Este normativa , en la práctica implica desarrollar nuevos estudios preliminares de evaluación del tipo de suelo así como dotar de mayor reforzamiento a la estructura de los proyectos de inversión con el objetivo de asegurar un mejor compartimiento de nuestros edificios, frente a eventuales sismos de gran intensidad. Esto que si bien es cierto es algo positivo, impactó negativamente en los cronogramas de inversión de nuestros proyectos de inversión , tanto en los plazos estimados como en los costos involucrados , lo que implicó reevaluar en Mideplán todas las iniciativas de inversión en desarrollo para así cumplir con los estudios adicionales respectivos de suelos y ajustar el costo del proyecto respecto del valor original. Con esta nueva recomendación fue necesario solicitar una identificación de fondos de carácter complementaria , lo que en la práctica generó un atraso de por lo menos un semestre adicional al cronograma inicial de cada uno de los proyectos afectados .

	Nombre Proyecto	Fecha Solicitud Reevaluación	Etapa	Fecha nuevo RS	Observaciones
REEVALUACIONES	Fiscalía Local de Iquique	01-Abr-11	Diseño	20-Abr-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 4.311
	Fiscalía Local de Iquique	06-Jul-11	Diseño	28-Jul-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 16.448
	Fiscalía Local de Viña del Mar	06-Abr-11	Diseño	20-Abr-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 4.311
	Fiscalía Local de Viña del Mar	06-Jul-11	Diseño	28-Jul-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 4.556
	Fiscalía Local de Quipué	18-Jul-11	Diseño	11-Ago-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 11.513
	Fiscalía Local de San Antonio	26-Jul-11	Ejecución	04-Oct-11	Se incorpora Consultorías por M\$ 28.958
	Fiscalía Local de Pichilemu	10-Ago-11	Ejecución	09-Sep-11	Se incorpora Consultorías por M\$1.491
	Fiscalía Local de Linares	10-Ago-11	Ejecución	09-Sep-11	Se incorpora Consultorías por M\$ 25,610
	Fiscalía Local de Talca	26-Ago-11	Diseño	02-Sep-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 17.842
	Fiscalía Local de Chillán	20-Jul-11	Ejecución	28-Jul-11	Se incorpora Consultorías por M\$ 33.679
	Fiscalía Local de Talcahuano	18-Ago-11	Diseño	09-Sep-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 8.373
	Fiscalía Local de Los Lagos	10-Ago-11	Ejecución	09-Sep-11	Se incorpora Consultorías por M\$ 8.097
	Fiscalía Local de Porvenir	04-Jul-11	Diseño	25-Jul-11	Se aumenta Consultorías en M\$ 24.805
	Fiscalía Local de Maipú	25-Nov-11	Ejecución	28-Dic-11	Se incorpora Consultorías por M\$ 42.281 , y aumenta Obras Civiles en M\$ 776.798 .-

*Los montos se consideran en moneda año 2012

	Nombre Proyecto	Fecha Solicitud Cambio de Etapa	Fecha RS
CAMBIOS DE ETAPA	Fiscalía Local de Chillán	29-Abr-11	23-May-11
	FR y FL Rancagua	10-Jun-11	22-Jun-11
	FL Lautaro	28-Sep-11	26-Oct-11
	Fiscalía Local de Osorno	25-Ago-11	15-Sep-11

	Nombre Proyecto	Fecha Solicitud Ingreso Proyecto	Etapa	Estado RATE
INGRESO	Fiscalía Local de Pudahuel	05-Ago-11	Ejecución	RS/26-Ene-2012

De los proyectos a destacar que iniciaron sus gestiones durante el año 2011 están: la ejecución del proyecto "Reparación y Reforzamiento de la FL de Pudahuel , una anhelada obra de Mejoramiento que se logró gestionar durante el año pasado, a través de la recomendación favorable de Mideplán y por otra parte logramos avanzar en la consultoría de diseño de la ampliación de la FL de Maipú, dónde luego de realizar los respectivos estudios técnico y económicos, he tomado la decisión de que se emplace en el terreno de la FL de Maipú; " la Fiscalía Regional Occidente" . En consecuencia funcionará en el antiguo inmueble de calle Teniente Cruz sólo la Fiscalía local de Pudahuel . Ambos proyectos como lo mencionaba cuentan con recomendación favorable , y con la respectiva identificación de fondos para dar inicio durante el presente año 2012 al desarrollo de ambos proyectos.
